

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA

Projeto: Preservar para conhecer, conhecer para preservar - narrar, restaurar e recriar a Rotunda Ferroviária de Ribeirão Vermelho


Proponente: Arquitetas sem Fronteiras

Local: Ribeirão Vermelho, MG


Responsável Técnico: Eduardo Santos

No dia 06 de fevereiro de 2026, a equipe do Semente, representada por Luisa Portella e Eduardo Santos, participou da visita técnica a Ribeirão Vermelho, onde estão sendo realizadas as atividades do projeto *Preservar para conhecer, conhecer para preservar – narrar, restaurar e recriar a Rotunda Ferroviária de Ribeirão Vermelho*.

O projeto tem como objetivo dar continuidade às obras de restauração da Rotunda Ferroviária de Ribeirão Vermelho e realizar atividades de engajamento comunitário e educação patrimonial. O projeto realizará a restauração e recuperação das esquadrias, paredes e colunas da Rotunda Ferroviária, além de elaborar um caderno de diretrizes para restauro e conservação do bem.

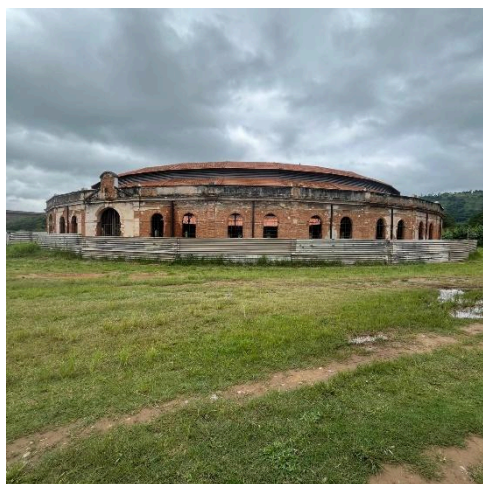

*Rotunda Ferroviária de Ribeirão Vermelho.
Autoria: Eduardo Santos
Data: 06/02/2026*

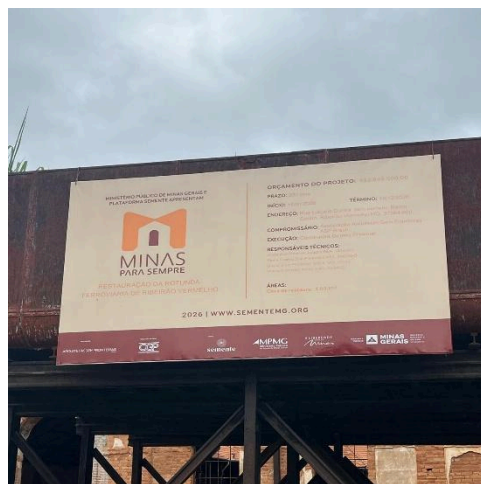

*Placa de obras do projeto.
Autoria: Eduardo Santos
Data: 06/02/2026*



A visita foi iniciada às 09h30 com a presença da equipe da instituição proponente, Arquitetas Sem Fronteiras, e a equipe técnica do IEPHA-MG. Durante a visita, a equipe do projeto informou que após o início das atividades preliminares, foi identificada a necessidade de realização de reforço nas estruturas de sustentação da cobertura (pilares) uma vez que as existentes estão comprometidas. Além do reforço estrutural, é necessário realizar a execução de um sistema de drenagem no local. Tal drenagem será executada pela Prefeitura Municipal de Ribeirão Vermelho antes do início das obras previstas no projeto.

Foi realizada uma reunião de alinhamento na obra, na qual o prefeito de Ribeirão Vermelho participou e informou quanto à impossibilidade de execução do sistema de drenagem no momento. Devido às condições do terreno no local, perfaz-se a impossibilidade de realizar a escavação com os equipamentos disponíveis.



*Vista interna da cobertura da Rotunda.
Autoria: Eduardo Santos
Data: 06/02/2026*



*Alvenaria e esquadrias da Rotunda.
Autoria: Eduardo Santos
Data: 06/02/2026*

Ao final da visita, foi definido que após a elaboração do projeto de reforço estrutural, o mesmo será enviado ao IEPHA para aprovação antes do início da execução. A equipe do Arquitetisa sem Fronteiras irá verificar a possibilidade de



execução do reforço estrutural e do sistema de drenagem, desde que não prejudique a execução das demais atividades previstas no projeto.

Apesar dos imprevistos técnicos identificados quanto às atividades prévias ao projeto, o mesmo segue sendo executado de acordo com o cronograma previsto.

Sem mais,

Belo Horizonte, 02 de março de 2026.
