


## RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA

**Projetos:** RESTAURA – Igreja Matriz de Bom Sucesso e ILUMINA – Igreja Matriz de Bom Sucesso

**Proponente:** Agência de Desenvolvimento Regional Integrado - ADERI

**Responsável Técnico:** Francielle Ferreira

No dia 04 de junho, a equipe do Semente, representada por Francielle Ferreira e Maria Letícia Ticle, bem como a equipe da Agência de Desenvolvimento Regional Integrado - ADERI, representada pelo arquiteto Hebert Gerson, o técnico em elétrica Eurimar Gomes, o gestor do contrato Carlos Barbosa e sua assistente Andreia Rosa, participaram da visita técnica ao município de Caeté para acompanhamento dos projetos *RESTAURA* e *ILUMINA – Igreja Matriz de Bom Sucesso*, contemplados no âmbito do Programa Minas Para Sempre.

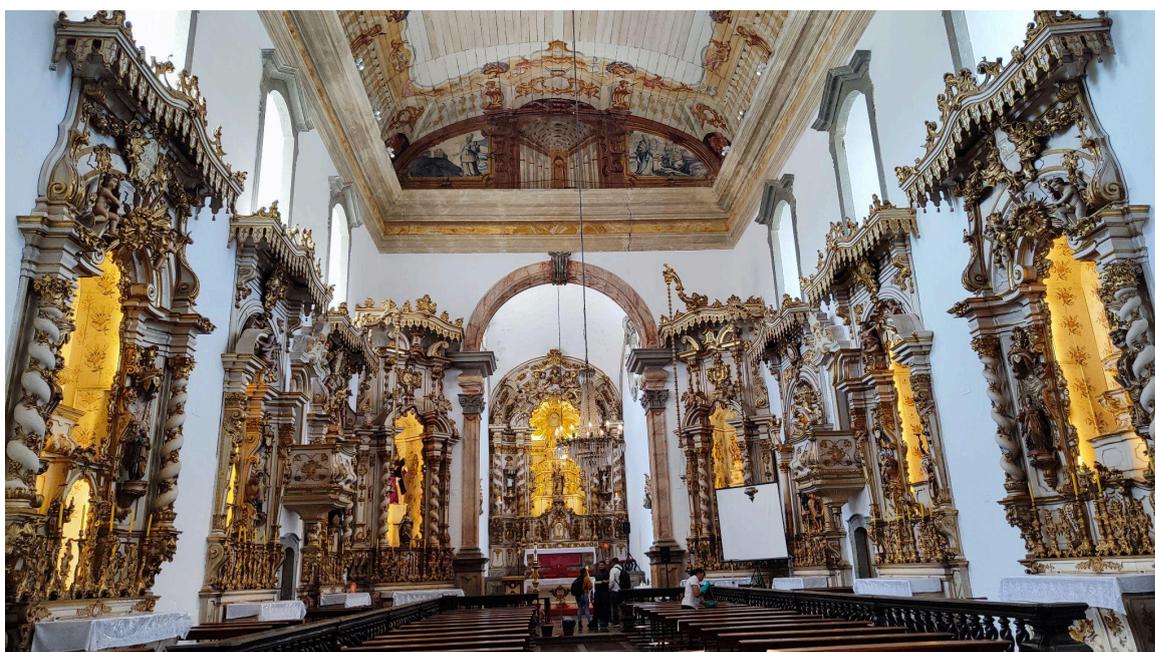

*Igreja Matriz de Bom Sucesso, em Caeté/MG.*

*Autoria: Francielle Ferreira*

*Data: 04/06/2025*

O objetivo da visita, portanto, foi o acompanhamento da execução das propostas de intervenções previstas nos projetos submetidos e contemplados via Plataforma Semente, que contempla a execução dos seguintes serviços:

## RESTAURA – Igreja Matriz de Bom Sucesso:

### **Restauração forro da nave**

- Montagem de andaimes;
- Desmonte das tábuas do forro;
- Restauração das peças do forro: consolidação de suporte, emassamento e nivelamento, reintegração das cores;
- Remontagem das tábuas.

### **Restauração piso de campas da capela-mor, nave e átrio**

- Mapeamento e numeração das campas;
- Remoção das campas;
- Limpeza superficial, embalagem para transporte e transporte para o ateliê de restauro;
- Recuperação dos danos estruturais existentes;
- Imunização preventiva;
- Remoção da cera atual, aplicação de líquido selador, aplicação de cera líquida;
- Reinstalação das campas restauradas.

### **Restauração Retábulo**

- Higienização, imunização e desinfestação do suporte;
- Refixação de peças soltas, recomposição de áreas faltantes e consolidação do suporte e calafetação;
- Fixação da camada pictórica;
- Remoção mecânica e limpeza química;
- Revisão da fixação da camada pictórica;
- Emassamento e nivelamento de lacunas;
- Reintegração cromática, aplicação de nova camada de pintura em áreas de substituição do suporte;
- Aplicação de bolo armênio amarelo nos ornatos, frisos e cordões da parte inferior do retábulo;
- Aplicação de verniz de proteção.

### **Descupinização do suporte em madeira dos retábulos**

- Mapeamento de pontos de cupins;
- Descupinização.

ILUMINA – Igreja Matriz de Bom Sucesso:

- Infraestrutura das instalações elétricas e luminotécnicas, preparo de alvenarias, colocação de eletrodutos, conexões, caixas, etc;
- Instalação de interruptores e tomadas;
- Instalação de disjuntores e quadros;
- Instalação de luminárias, lâmpadas e reatores;
- Instalação de disjuntores e quadros;
- Infraestrutura preparada para receber as instalações de segurança eletrônica;
- Infraestrutura preparada para receber as instalações de som.

A visita foi conduzida pelo gestor do contrato para análise das atividades em execução, bem como das etapas que já estão finalizadas. Das atividades previstas no projeto *RESTAURA - Igreja Matriz de Bom Sucesso*, os serviços de restauração das tábuas do forro da nave e restauração de trechos do piso deampa da igreja foram finalizados, conforme imagem abaixo:




*Forro da nave restaurado  
Autoria: Francielle Ferreira  
Data: 04/06/2025*

A restauração das tábuas do forro foi finalizada e as peças restauradas foram reinseridas no forro da nave. O serviço executado buscou preservar a autenticidade dos elementos pictóricos existentes e em observância aos princípios e critérios técnicos aplicáveis às intervenções em bens protegidos. O resultado da restauração do forro da nave segue apresentado abaixo:




*Restauração do forro da nave  
Autoria: Francielle Ferreira  
Data: 04/06/2025*

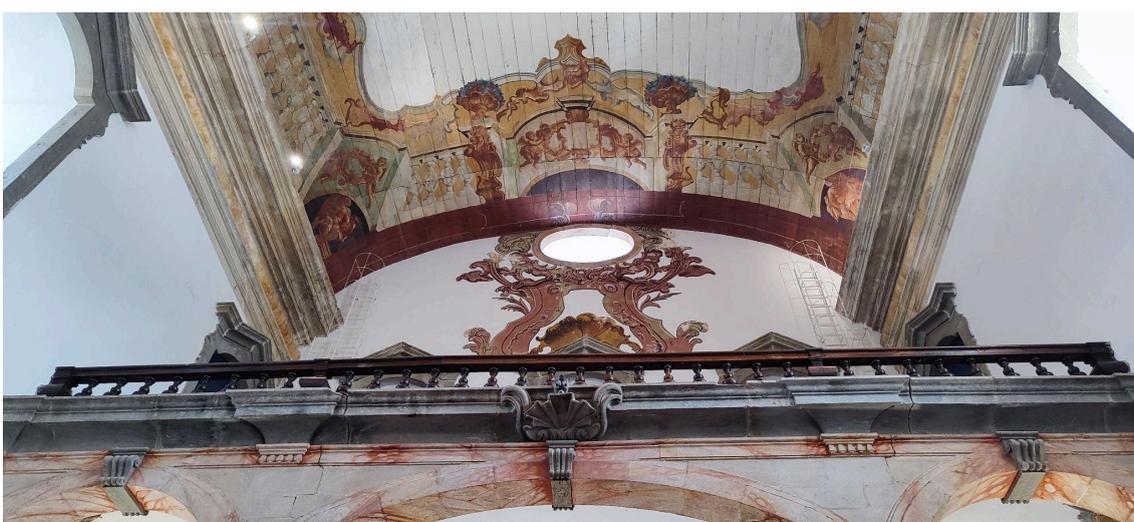

*Restauração do forro da nave  
Autoria: Francielle Ferreira  
Data: 04/06/2025*



*Forro da nave restaurado  
Autoria: Francielle Ferreira  
Data: 04/06/2025*

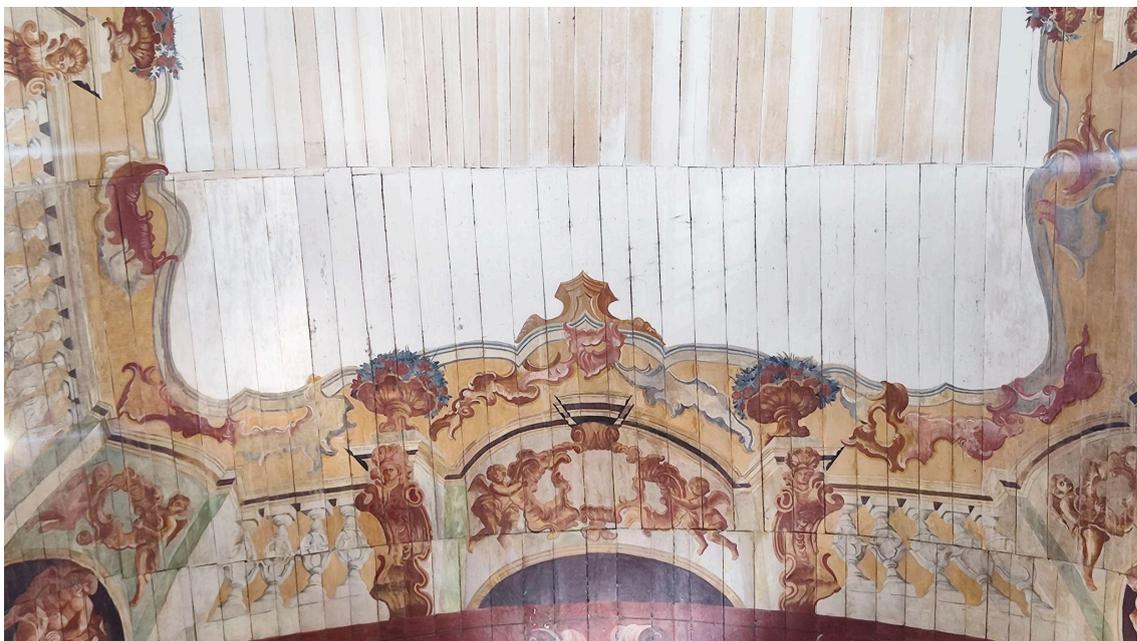


*Forro da nave restaurado  
Autoria: Francielle Ferreira  
Data: 04/06/2025*

Os serviços de recuperação e restauração do piso de campas da igreja também foram finalizados e as campas restauradas foram reinstaladas em seu local de origem, conforme mapeamento prévio realizado.




*Piso da nave - restauração das campas finalizadas  
Autoria: Francielle Ferreira  
Data: 04/06/2025*

Já em relação ao projeto *ILUMINA - Igreja Matriz de Bom Sucesso*, o serviço de execução de infraestrutura elétrica interna foi finalizado, tendo sido concluído a instalação do cabeamento e das luminárias internas na sacristia, em todos os elementos integrados da nave, no batistério e na capela-mor, conforme ilustram as imagens abaixo.

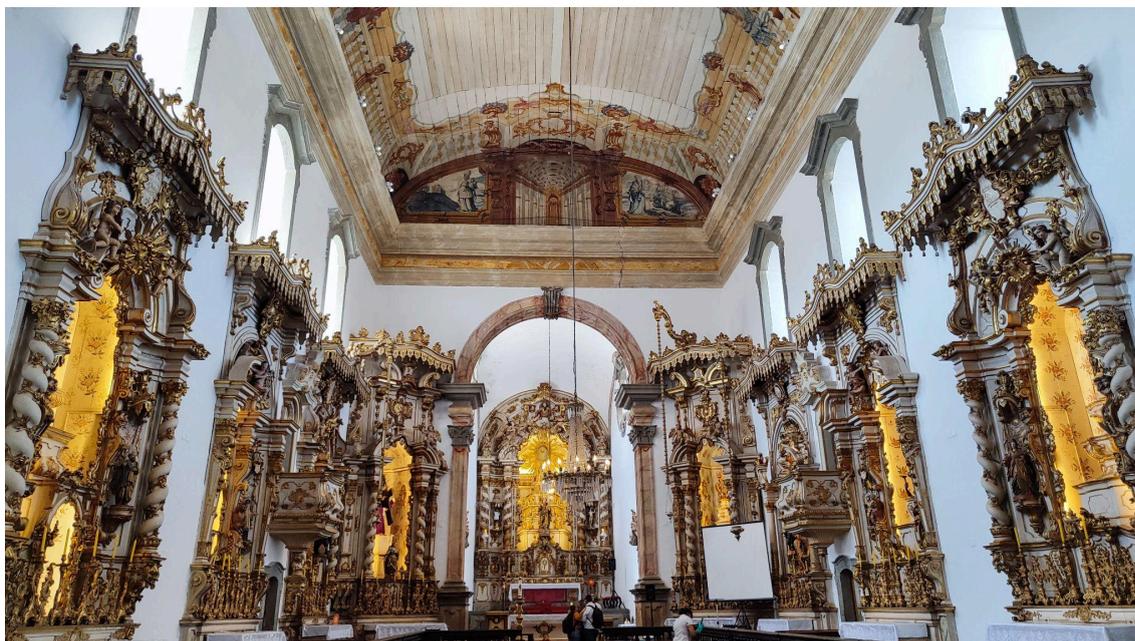

*Iluminação dos retábulos instalada e em funcionamento*  
*Autoria: Francielle Ferreira*  
*Data: 04/06/2025*

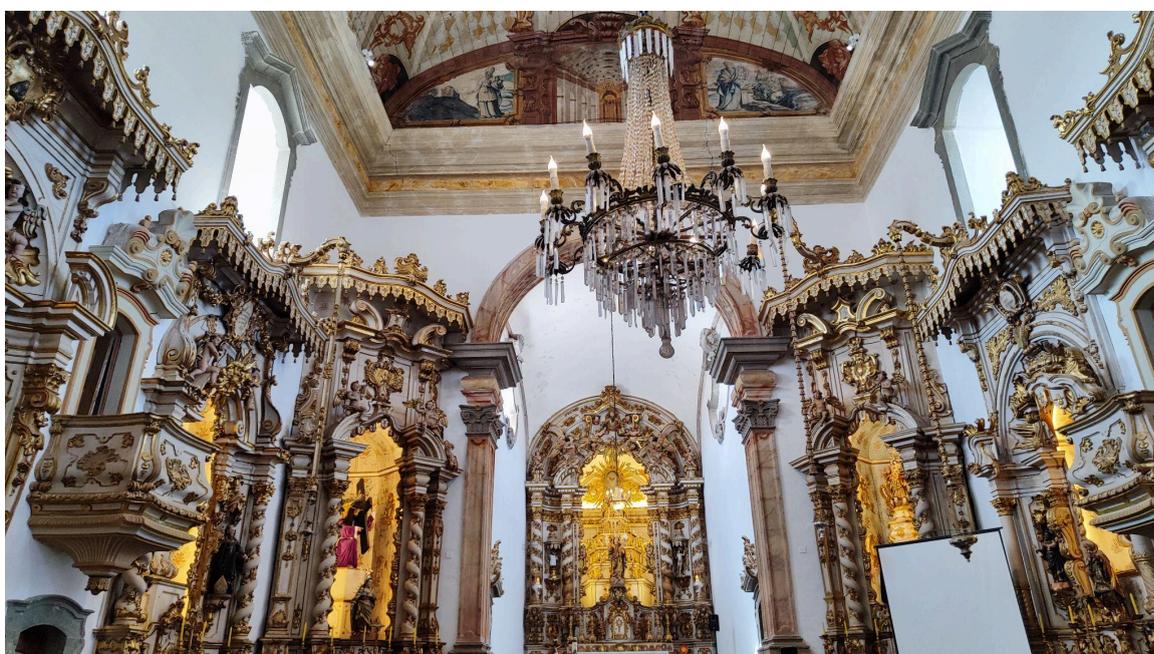

*Iluminação dos retábulos instalada e em funcionamento*  
*Autoria: Francielle Ferreira*  
*Data: 04/06/2025*




*Iluminação interna dos retábulos colaterais executada.  
Autoria: Francielle Ferreira  
Data: 04/06/2025*



*Iluminação dos retábulo-mor executada.  
Autoria: Francielle Ferreira  
Data: 04/06/2025*




*Iluminação dos retábulo-mor executada.  
Autoria: Francielle Ferreira  
Data: 04/06/2025*

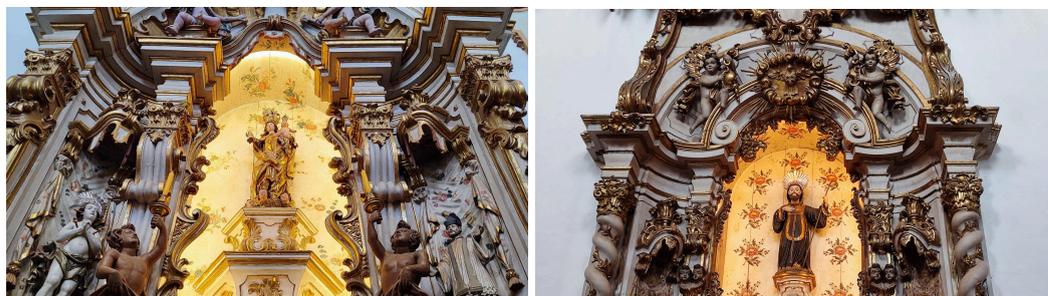

*Resultado da iluminação focada nas imagens entronizadas nos retábulos  
Autoria: Francielle Ferreira  
Data: 04/06/2025*

A pintura interna da edificação foi finalizada e a pintura externa das fachadas, cimalhas e enquadramentos estão em processo de finalização, aguardando a mobilização da plataforma elevatória que estava prevista para chegar na obra nos dias seguintes ao da visita.

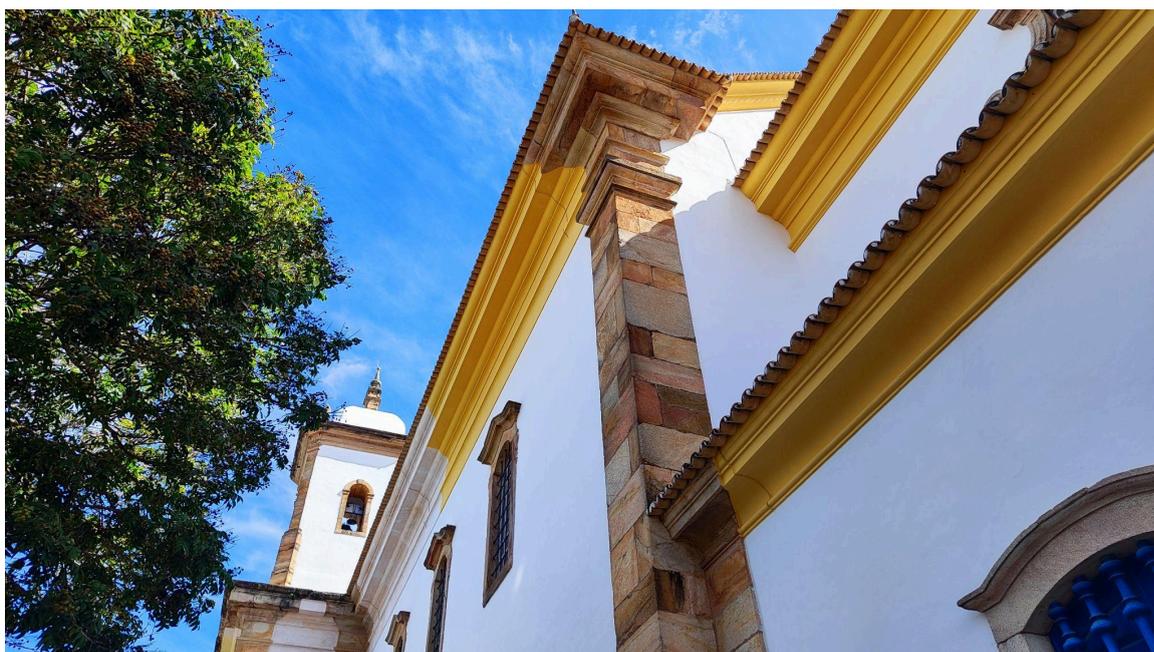

*Pintura das alvenarias, cimalhas e enquadramentos da fachada lateral em execução*  
Autoria: Francielle Ferreira  
Data: 04/06/2025



*Vista no nível do pátio da edificação dos resultados da pintura das alvenarias.*  
Autoria: Francielle Ferreira  
Data: 04/06/2025



*Pintura das alvenarias, cimalthas e enquadramentos da fachada frontal em execução  
Autoria: Francielle Ferreira  
Data: 04/06/2025*

Ao final, foi realizada uma reunião com representantes da Arquidiocese, da empresa contratada e da paróquia, de modo a definir os próximos passos para a finalização das obras.

Por último, foi solicitado ao proponente que sejam regularizadas formalmente junto a Plataforma Semente todas as pendências referentes às adequações da planilha orçamentária do projeto Ilumina.

Sem mais,

Belo Horizonte, 26 de junho de 2025.
