

RELATÓRIO DE VISITA

Projeto: Orla – o contorno da vida

Local: Município de Ipaba - Comarca de Ipatinga

Responsável Técnico: Thaís Calhau Freitas

No dia 09 de julho de 2025, a analista do Semente – Núcleo Ipatinga, Thaís Calhau, compareceu ao município de Ipaba/MG em visita técnica para acompanhamento e monitoramento das atividades em execução do Projeto *Orla – o contorno da vida*, que tem por objetivo a reestruturação de áreas do entorno da lagoa central do município de Ipaba.

Durante a visita, verificou-se que a execução do acabamento dos passeios, com a instalação dos blocos laterais dos intertravados, está sendo concluída. Também estava sendo instalado o brinquedo em uma área de playground, adquirido com o remanejamento de rubrica.

O tapume já foi integralmente retirado, como também foram instalados os quadros de energia elétrica, restando para a última etapa a instalação de quatro postes de iluminação no deck.

Restam, ainda, o alambrado de cobertura da quadra de areia, o plantio de grama e vegetação que irão compor o paisagismo restante e a limpeza de toda a área do projeto.

Questionado quanto ao término da obra, uma vez que na última visita já estavam pendentes os mesmos itens, o proponente explicou que houve problemas com a equipe de execução anterior, a qual foi trocada pela empresa executora. Além disso, o proponente destacou que aguardava resposta da solicitação de remanejamento de rubrica.

Por fim, no tocante à área onde se executará posteriormente o quiosque, cuja licitação já foi homologada (Processo licitatório nº 0277/2024), foi informado que, no prazo de 30 dias, o licitante iniciará a construção.



Aguarda-se a execução dos acabamentos finais, bem como da limpeza da obra, com a previsão dada pelo proponente para então dar-se por concluído o projeto, nos termos do plano de monitoramento e metodologia.

Sem mais para o momento, sendo este o relatório de toda a visita de acompanhamento. Seguem fotos anexas.

Ipatinga/MG, 09 de julho de 2025.

Thaís Calhau Freitas
Analista Semente Núcleo Ipatinga



Acabamento do calçamento de blocos intertravados sendo executado.






Acabamento do calçamento de blocos intertravados executado.



Área do deck compactada, terraplenada e aguardando o plantio de gramas.

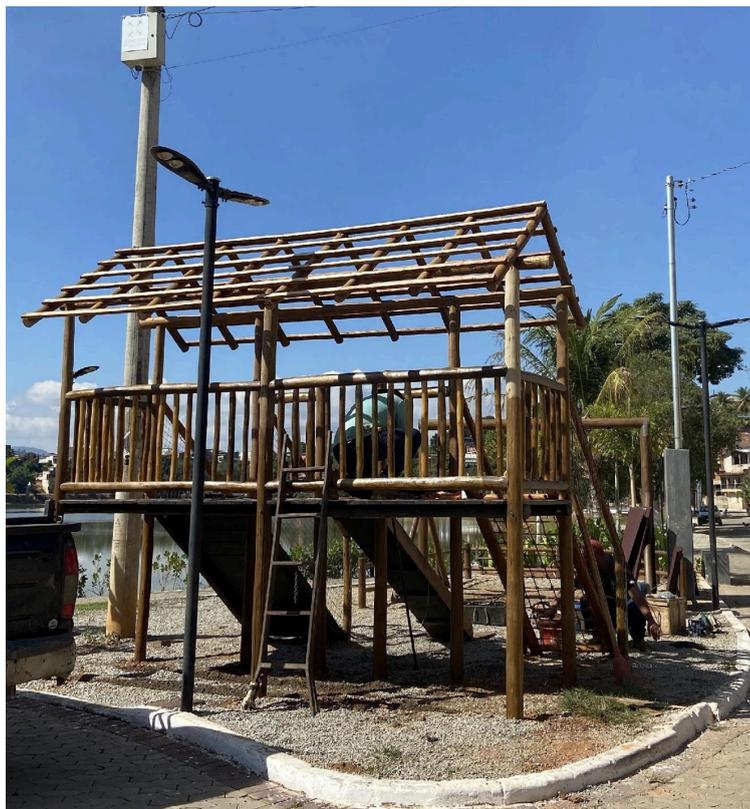

Novo brinquedo sendo instalado.



Equipe responsável pelo projeto Orla – o contorno da vida.
