

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA

Projetos: RESTAURA – Igreja Matriz de Bom Sucesso e ILUMINA – Igreja Matriz de Bom Sucesso

Proponente: Agência de Desenvolvimento Regional Integrado - ADERI

Local: Caeté - MG

Responsável Técnico: Francielle Ferreira

No dia 02 de outubro, a equipe do Semente, representada por Francielle Ferreira e Maria Letícia Ticle, bem como a equipe da Agência de Desenvolvimento Regional Integrado - ADERI, representada pelo arquiteto Hebert Gerson, o técnico em elétrica Eurimar Gomes e o gestor do contrato Carlos Barbosa, participaram da visita técnica ao município de Caeté, para acompanhamento dos projetos RESTAURA e ILUMINA – Igreja Matriz de Bom Sucesso, contemplados no âmbito do Programa Minas Para Sempre.



Legenda: Igreja Matriz de Bom Sucesso, em Caeté/MG.

Autoria: Francielle Ferreira

Data: 02/10/2024

O objetivo da visita, portanto, foi o acompanhamento da execução das propostas de intervenções previstas nos projetos submetidos e contemplados via Plataforma Semente, que contempla a execução dos seguintes serviços:

RESTAURA – Igreja Matriz de Bom Sucesso:

Restauração forro da nave

- Montagem de andaimes;
- Desmonte das tábuas do forro;
- Restauração das peças do forro: consolidação de suporte, emassamento e nivelamento, reintegração das cores;
- Remontagem das tábuas.

Restauração piso de campas da capela-mor, nave e átrio

- Mapeamento e numeração das campas;
- Remoção das campas;
- Limpeza superficial, embalagem para transporte e transporte para o ateliê de restauro;
- Recuperação dos danos estruturais existentes;
- Imunização preventiva;
- Remoção da cera atual, aplicação de líquido selador, aplicação de cera líquida;
- Reinstalação das campas restauradas.

Restauração Retábulo

- Higienização, imunização e desinfestação do suporte;
- Refixação de peças soltas, recomposição de áreas faltantes e consolidação do suporte e calafetação;
- Fixação da camada pictórica;
- Remoção mecânica e limpeza química;
- Revisão da fixação da camada pictórica;
- Emassamento e nivelamento de lacunas;
- Reintegração cromática, aplicação de nova camada de pintura em áreas de substituição do suporte;
- Aplicação de bolo armênio amarelo nos ornatos, frisos e cordões da parte inferior do retábulo;
- Aplicação de verniz de proteção.


Descupinização do suporte em madeira dos retábulos

- Mapeamento de pontos de cupins;
- Descupinização.

ILUMINA – Igreja Matriz de Bom Sucesso:

- Infraestrutura das instalações elétricas e luminotécnicas, preparo de alvenarias, colocação de eletrodutos, conexões, caixas, etc;
- Instalação de interruptores e tomadas;
- Instalação de Disjuntores e quadros;
- Instalação de Luminárias, lâmpadas e reatores;
- Instalação de Disjuntores e quadros;
- Infraestrutura preparada para receber as instalações de segurança eletrônica;
- Infraestrutura preparada para receber as instalações de som.


A visita foi guiada pelo gestor do contrato, para análise das atividades em execução, bem como das etapas que já estão finalizadas. Das atividades previstas no projeto RESTAURA - Igreja Matriz de Bom Sucesso, os serviços de remoção das tábuas do forro da nave e restauração de trechos do piso de campa da igreja estão sendo executados, conforme imagens abaixo:

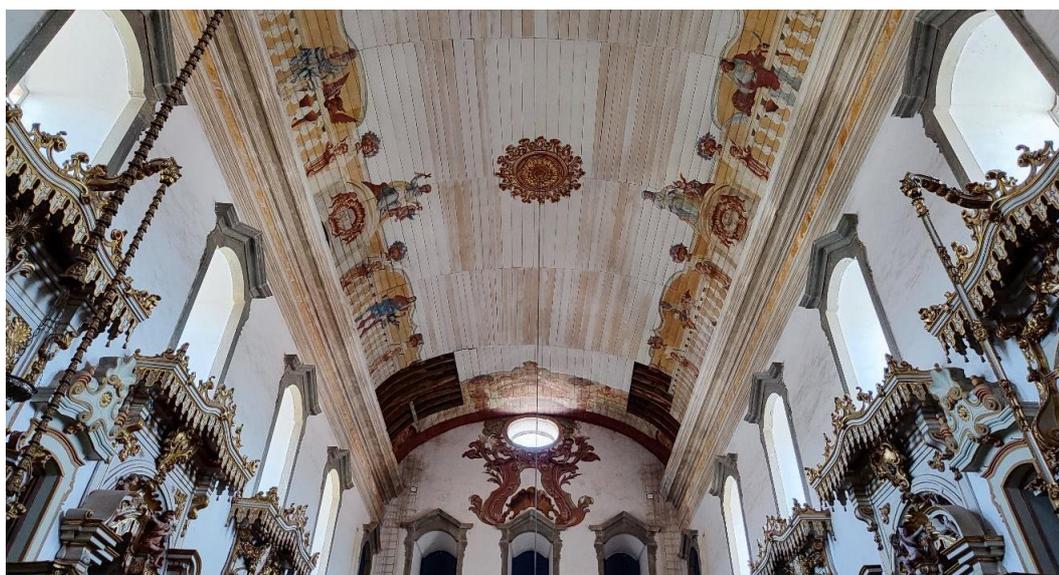


*Legenda: Restauração do forro da nave
Autoria: Francielle Ferreira
Data: 02/10/2024*



*Legenda: Restauração do forro da nave
Autoria: Francielle Ferreira
Data: 02/10/2024*

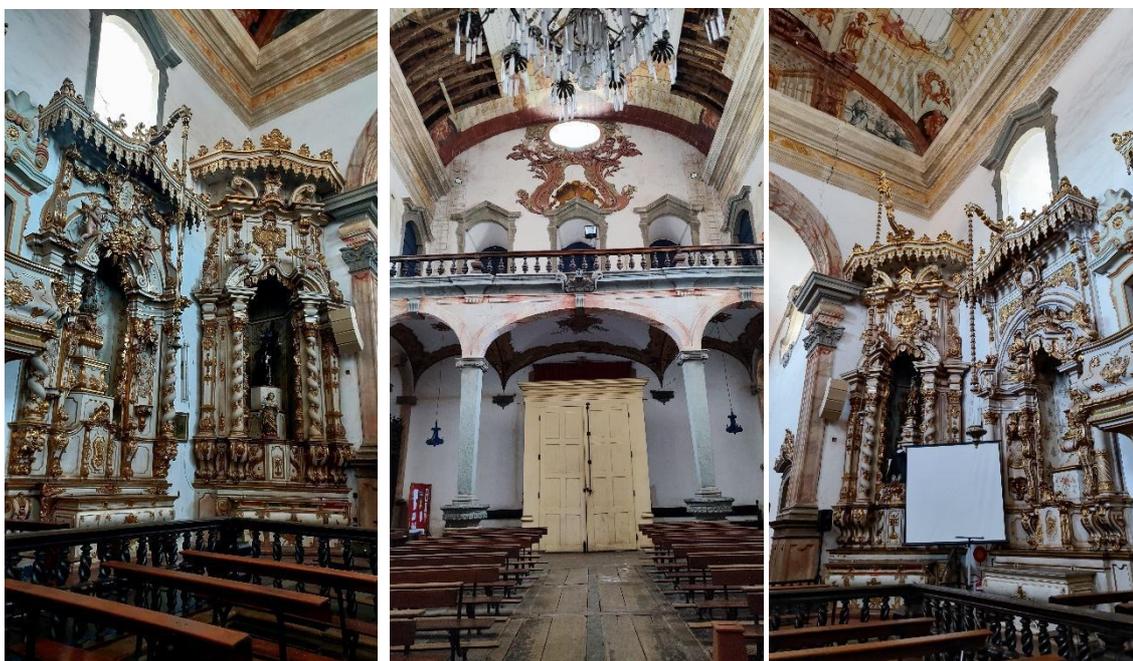

*Legenda: Restauração do forro da nave, e vista dos retábulos a serem higienizados
Autoria: Francielle Ferreira
Data: 02/10/2024*

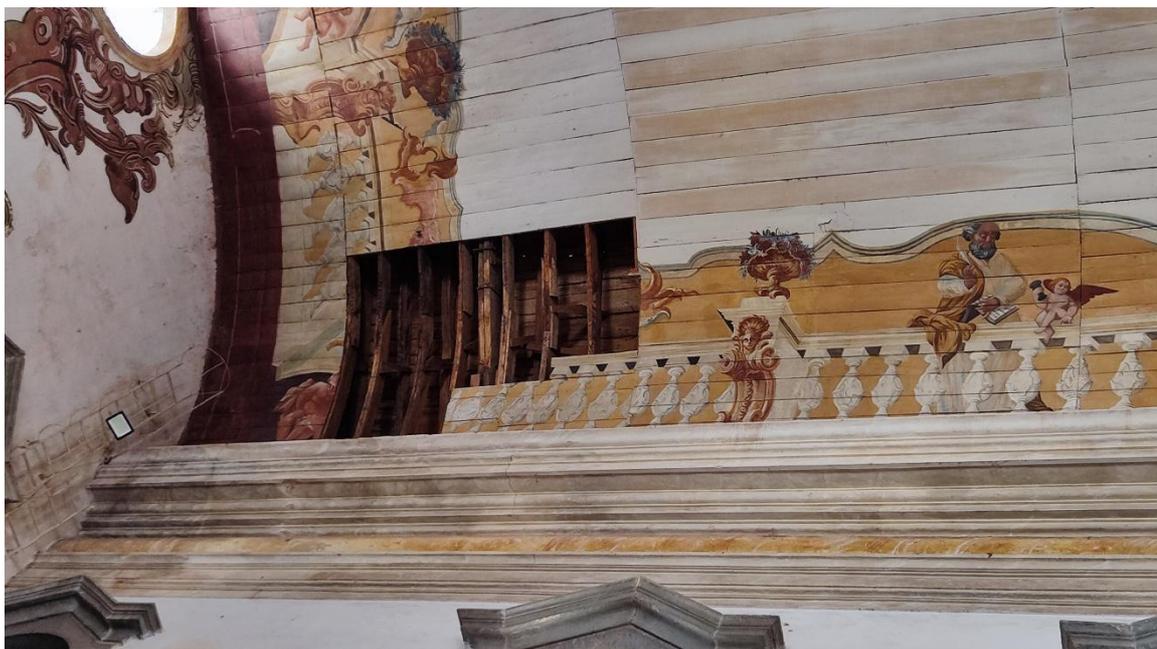

*Legenda: Restauração do forro da nave
Autoria: Francielle Ferreira
Data: 02/10/2024*

Quanto à restauração das tábuas do forro, continuam os serviços de restauração das peças no ateliê de restauro contratado. Estão sendo realizadas sua recomposição com a substituição das partes danificadas. Eventualmente, caso a

pintura se encontre em processo de descolamento, é utilizado um preparado à base de álcool polivinílico para a sua fixação.


Os serviços de recuperação e restauração do piso de campa da igreja estão em estado avançado de execução. Foram sanadas as questões relativas aos achados arqueológicos, de acordo com as determinações do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, após visita técnica à obra e análise dos materiais encontrados. As campas restauradas já foram reinstaladas em seu local de origem, conforme mapeamento realizado. Novas peças foram removidas para dar continuidade aos serviços de recuperação do suporte em madeira das campas, compreendendo a sua imunização, remoção das ceras aplicadas ao longo dos anos, consolidação e complementação do madeirame danificado, aplicação de cera.



*Legenda: Intervenção no piso de campa da Capela-Mor
Autoria: Francielle Ferreira
Data: 02/10/2024*

Já em relação ao projeto ILUMINA - Igreja Matriz de Bom Sucesso, o serviço de execução de infraestrutura segue sendo executado e as atividades de remoção

do reboco e abertura dos pontos para instalação da tubulação elétrica estão em andamento avançado na parte interna da edificação; vários pontos elétricos foram finalizados e as tubulações passadas pelos forros já estão em fase de finalização, conforme segue abaixo:

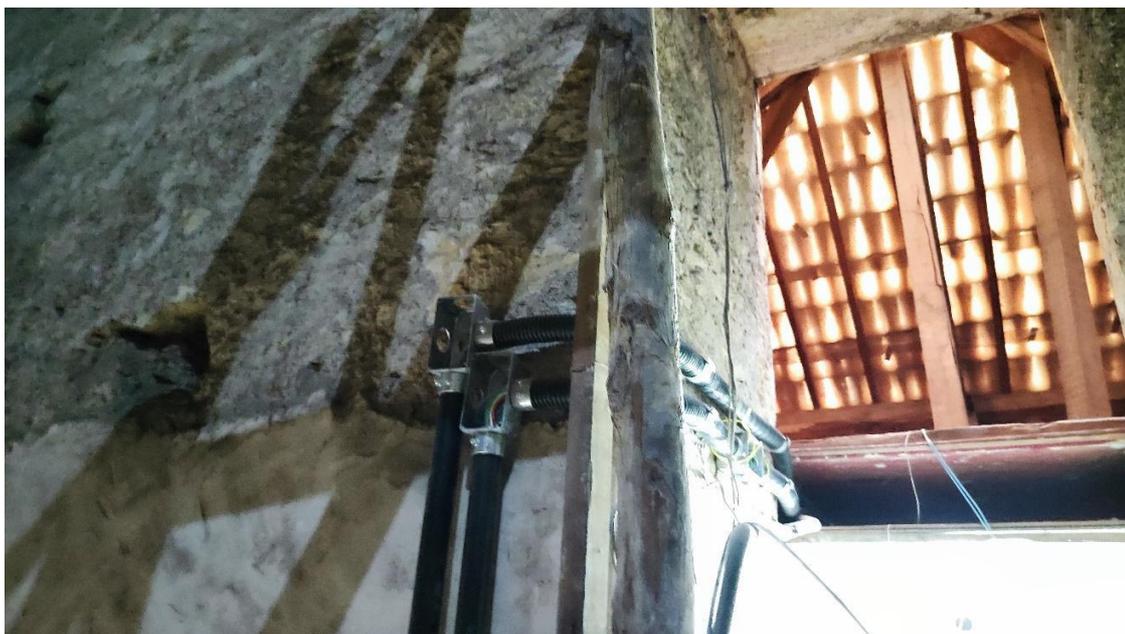

*Legenda: Execução da infraestrutura elétrica sobre a estrutura do retábulo
Autoria: Francielle Ferreira
Data: 02/10/2024*




*Legenda: Execução de infraestrutura elétrica e sobre o forro da capela-mor
Autoria: Francielle Ferreira
Data: 02/10/2024*

Os serviços de pintura interna foram iniciados e estão sendo executados com tinta mineral à base de silicato, conforme ilustram as imagens abaixo:



*Legenda: Proteção do lavabo da sacristia para pintura das alvenarias
Autoria: Francielle Ferreira
Data: 02/10/2024*

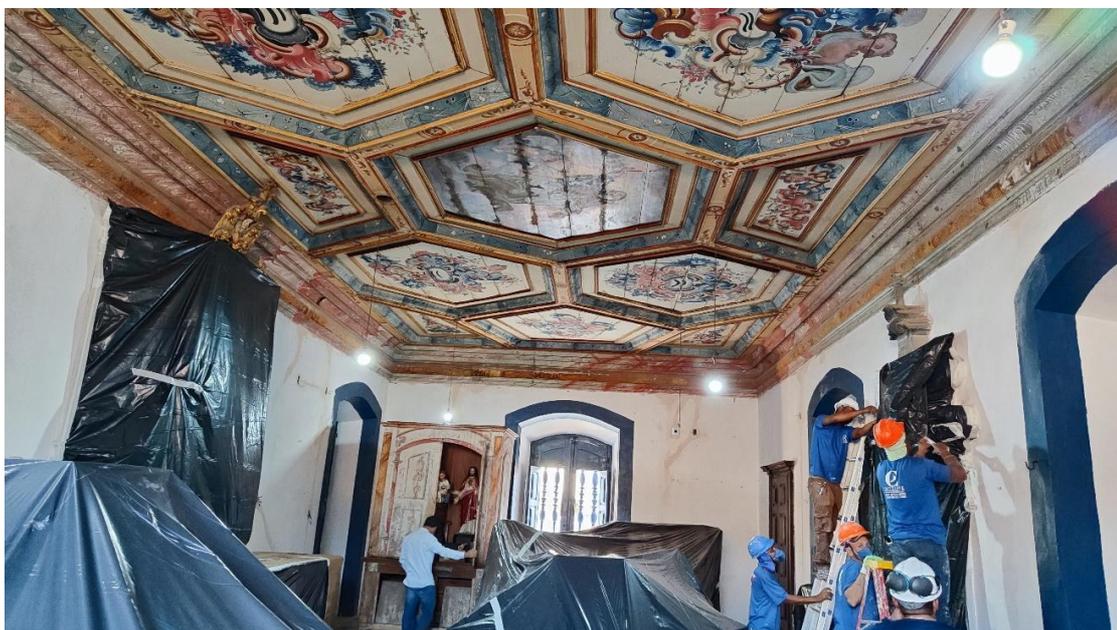

*Legenda: Proteção do lavabo da sacristia para pintura das alvenarias
Autoria: Francielle Ferreira
Data: 02/10/2024*

Por fim, foi realizada uma reunião com representantes da Arquidiocese, da empresa contratada e da paróquia, de modo a compreender as alterações de cronograma dos projetos e alinhamento do envio das prestações de contas em

atraso. Foi solicitado ao proponente que sejam formalizados a Plataforma Semente todos os remanejamentos de rubrica necessários diante das possíveis mudanças de escopo.

Ao final da visita, constatamos que o projeto está em andamento e que as atividades estão sendo executadas e satisfatoriamente recebidas pelos participantes.

Sem mais,

Belo Horizonte, 21 de outubro de 2024.
